

SF1-ETSP

Rapport KPI Performance & Qualité — SAP PM OCP • 18/09/2026

SCORE PERFORMANCE

100.0%

SCORE QUALITÉ

100.0%

ANOMALIES

12


INDICATEURS DE PERFORMANCE

Indicateur	Val.	Cible
TAUX_REALISATION_CORRECTIF/PT	100%	≥85
OT préparation <1 mois	100%	≥80
OT préparation 1mois< <3mois	0%	≤15
OT préparation >3 mois	0%	≤5
OT planification <1 mois	100%	≥80
OT planification 1mois< <3mois	0%	≤15
OT planification >3 mois	0%	≤5
OT exécution <1 mois	100%	≥80
OT exécution 1mois< <3mois	0%	≤15
OT exécution >3 mois	0%	≤5
Performance Graissage	100%	≥95
Performance Inspection	95%	≥95
Performance Systématiques	94%	≥85

INDICATEURS DE QUALITÉ

Indicateur	Val.	Cible
Taux d'approbation des Avis	100%	≥95
OT LANC ESTIME	100%	≥100
Backlog préparation caractérisé	100%	≥100
Backlog planification caractérisé	100%	≥100
OT CONFIME	100%	≥100
OT_COR_EGAL	99%	≥100
OT Fiabilité	100%	≥100
Total Avis de Panne	100%	≥100

ANOMALIES PAR INDICATEUR

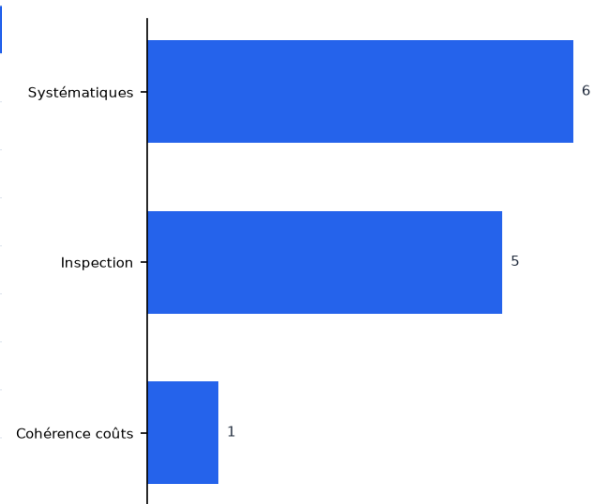

PLAN D'ACTION — TOUS LES INDICATEURS EN ANOMALIE (3)

Indicateur	Écart	Nécessité action	Responsable	Action
Performance Systématiques	+8.8	Oui	Chef d'Atelier	Respecter l'échéancier des interventions systématiques préventives.
Performance Inspection	-0.4	Oui	Chef d'Atelier	Réaliser l'ensemble des inspections planifiées et consigner les anomalies détectées.
OT_COR_EGAL	-0.9	Oui	Agent de Saisie	Contrôler la cohérence entre coûts budgétés et coûts réels, et corriger les OT dont les coûts ne sont pas cohérents (coûts réels = 0 ou égaux au budget).
