


INDICATEURS DE PERFORMANCE

Indicateur	Val.	Cible
TAUX_REALISATION_CORRECTIF/PT	100%	≥85
OT préparation <1 mois	100%	≥80
OT préparation 1mois< <3mois	0%	≤15
OT préparation >3 mois	0%	≤5
OT planification <1 mois	100%	≥80
OT planification 1mois< <3mois	0%	≤15
OT planification >3 mois	0%	≤5
OT exécution <1 mois	100%	≥80
OT exécution 1mois< <3mois	0%	≤15
OT exécution >3 mois	0%	≤5
Performance Graissage	100%	≥95
Performance Inspection	100%	≥95
Performance Systématiques	100%	≥85

INDICATEURS DE QUALITÉ

Indicateur	Val.	Cible
Taux d'approbation des Avis	84%	≥95
OT LANC ESTIME	100%	≥100
Backlog préparation caractérisé	100%	≥100
Backlog planification caractérisé	100%	≥100
OT CONFIME	100%	≥100
OT_COR_EGAL	99%	≥100
OT Fiabilité	100%	≥100
Total Avis de Panne	100%	≥100

ANOMALIES PAR INDICATEUR



PLAN D'ACTION — 5 INDICATEUR(S) EN ANOMALIE

Indicateur	Valeur	Cible	Anom.	Responsable	Action corrective
OT exécution <1 mois	100%	80%	51	Chef d'Atelier	Exécuter les ordres lancés conformément au planning hebdomadaire validé.
OT_COR_EGAL	99%	100%	10	Agent de Saisie	Contrôler la cohérence entre coûts budgétés et coûts réels, et corriger les OT dont les coûts ne sont pas cohérents (coûts réels = 0 ou égaux au budget).
OT planification <1 mois	100%	80%	5	Planificateur Méthodes	Programmer les OT dans le planning hebdomadaire de maintenance selon les priorités.
TAUX_REALISATION_CORRECTIF/PT	100%	85%	3	Chef d'Atelier	Augmenter le taux de réalisation et clôturer techniquement les OT terminés (CLOT/TCLO).
Taux d'approbation des Avis	84%	95%	3	Chef d'Atelier	Examiner et approuver les avis de maintenance en attente dans SAP (statut APRV).

ÉVOLUTION S38 (18/09) → S39 (25/09) — SF1-MPS4

SCORE PERFORMANCE

100.0%

S38 (18/09) : 100.0% = stable

TOTAL ANOMALIES

72

S38 (18/09) : 5 ▲ +67

SCORE QUALITÉ


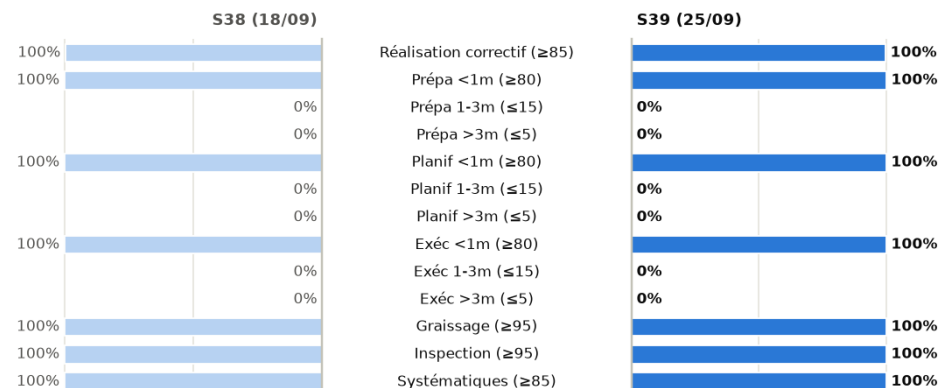
87.5%

S38 (18/09) : 75.0% ▲ +12.5 pt

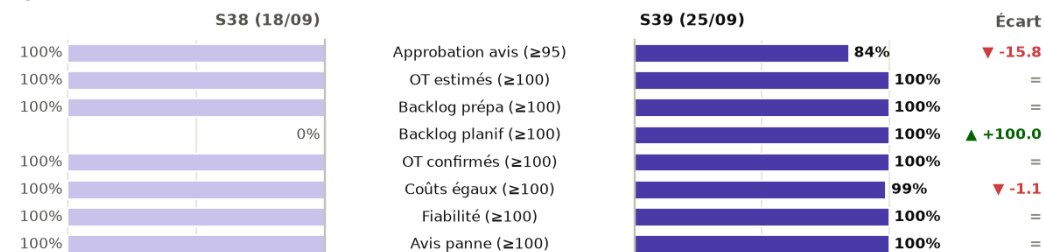
INDICATEURS EN ANOMALIE

5

sur 21 suivis

**Performance – valeur de l'indicateur**

Cible entre parenthèses ; pour « $\leq$ » une baisse est une amélioration. ▲ amélioration · ▼ dégradation. S = dernière extraction, S-1 = dernière extraction de la semaine précédente.

Qualité – valeur de l'indicateur


BACKLOG CARACTÉRISATION — extraction du 25/09/2026

Préparation



Code	Signification	Nb OT	%
ATPD	Attente PDR	4	100%
ATMR	Attente marché	0	0%
ATRS	Attente ressources	0	0%
ATMO	Attente moyens ou Outillage	0	0%
ATER	Attente équipement de rechange	0	0%
Total		4	100%

Planification



Code	Signification	Nb	OT	%
ATEI	Attente arrêt équipement ou Installation	17		25%
ATAL	Attente arrêt ligne	9		13%
ATAS	Attente arrêt site	0		0%
AGAR	Attente grand arrêt de révision	42		62%
ATHS	Attente HSE	0		0%
Total		68		100%

Nombre total traité : il compare deux extractions enregistrées du backlog caractérisation ; une seule est disponible pour l'instant — il sera calculé automatiquement à la prochaine extraction.
